

ด่วน

สภากาชาดไทย

บันทึกข้อความ

EM-22-เมย-57 พ.อาตบ.

Fo-3.6

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รศ. นพ. พงศ์ ภาณี ประดิษฐ์

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 27/2558 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 26/2558

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการฯ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมานมันตากรณี (ห้องเล็ก) ตึก ภปร ชั้น 18

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ดร. ก. N 15 เมย 14.00 น.



(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- | | |
|--|---|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ | กรรมการ |
| 8. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เกษขจรสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายสัตยศาสตร์ | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | กรรมการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา | กรรมการ |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา | กรรมการ |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา | กรรมการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา | กรรมการ |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง | กรรมการ |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ | กรรมการ |
| 19. น.ส.พัชรา ดุลยวสินพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 20. น.ส.วรมน เดชเมธาวิพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 21. น.ส.จิตรา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชูติวงศ์ | ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม | (เชิญพิเศษ) |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง | (เชิญพิเศษ) |

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 027/2558

วันที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมนต์ตารณ (ห้องเล็ก) ตึก กปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หน้า 1 ของ 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

3.1 งานก่อสร้างอาคาร

3.2 งานตกแต่งภายใน

3.3 งานทางเดินเชื่อม

98.5 f. Italian Th.
- ค้างคก แก่งทาง 0/0
- Left 92 f. ลิฟท์ 46 น
Dump Lift 6 -
30 มว Italian Th 52 =
รวมของวางเดินคก,

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร

4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11

1- 29 กพ 59 Ward x
OR

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ





















วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการที่ก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ PMO ครั้งที่ 026/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ ...!!

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายเซ็น
1.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	
2.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เดลิตซ์จรสุข (รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์	
11.	หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์	
12.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	 (นพ.)
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	 (นพ.)
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	
16.	หัวหน้าฝ่าย โสต ศอ นาสิกวิทยา	 (นพ.)
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร	
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
21.	น.ส.พัชรา ดุลยสินพงษ์	
22.	น.ส.วรมน เดชเมธาวีพงษ์	
23.	น.ส.จิตรา จันทนะกิจ	
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย	
25.	นายณภดล บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	นายครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ	
28.	นายนพรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายโอภาส สกุลศิริกมล ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
30.	นางเพชรสิริ สุวรรณประเสริฐ	
31.	อ. พงษ์ภักดิ์ วัฒนวิถ.	
32.		
33.		
34.		
35.		

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 026/2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 11

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้างอาคาร
3.2 งานตกแต่งภายใน
3.3 งานทางเดินเชื่อม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

① 22-24 พค. Active Aging สมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๖ พรรษา

370, 200, 200 = 6 นก. 13

0. สก. ๖๖๖ : เลข ๖๖๖๒

② 30 พ.ค. ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖
๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖

③ 23 เม.ย. ร.ตม. ๖๖๖๖
๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
1.	เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี	Info
2.	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2557 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2557	.
3.	ความก้าวหน้าของงาน 3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 97% เป็นไปตามแผนงานเมื่อเทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 - PMC รายงานเพิ่มเติมว่า งานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม (484 ล้านบาท) ดำเนินการไปแล้ว 95.5% - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมผลงาน 90% โดยสถานะการติดตั้ง(ทั้งหมด 53 ชุด) มีลิฟต์ที่ทดสอบแล้ว 24 ชุด อยู่ระหว่างทดสอบ 17 ชุด และอยู่ระหว่างการติดตั้ง 1 ชุด ส่วนบันไดเลื่อนอยู่ระหว่างการทดสอบ 6 ชุด - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ลิฟต์ที่ได้รับความเสียหายจากการหาน้ำเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 29 แล้วไม่ได้ปิดวาล์ว ทำให้น้ำไหลเข้าช่องลิฟต์จนเกิดความเสียหายนั้น ต้องสั่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน ได้เจรจาให้ผู้รับจ้างเร่งให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการยืนยันเป็นทางการอีกครั้ง - ประธานฯ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ชั้น 29 มิลลิฟต์ใช้ในการทำงานก่อสร้างเพียง 1 ชุด ทำให้มีปัญหาติดขัดในการขนส่งวัสดุ และแรงงานประมาณ 1 สัปดาห์ แต่การก่อสร้างยังดำเนินการได้ตามปกติ ขณะนี้ได้ซ่อมลิฟต์ให้ใช้งานได้แล้ว 2 ชุด - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV และ Access control) ขณะนี้กำลังเตรียมงานห้องควบคุม และเริ่มติดตั้ง Access Control ที่ชั้น 3, 17, 19 - ที่ประชุมรับทราบ	Info

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 4 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																																																													
	<p>3.2. ความก้าวหน้าของงานตกแต่งภายใน</p> <p>PMC รายงานความก้าวหน้า ของการรับมอบพื้นที่เพื่อตกแต่งภายใน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">โครงการ</th> <th rowspan="2">ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)</th> <th rowspan="2">จำนวน (เดือน)</th> <th colspan="2">ระยะเวลา</th> <th colspan="2">รับมอบพื้นที่</th> </tr> <tr> <th>เริ่มงาน</th> <th>วันสิ้นสุด</th> <th>รับแล้ว</th> <th>เตรียม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ชั้น B1-2 (TASK)</td> <td>182,000,000</td> <td>14</td> <td>2 ตุลาคม 57</td> <td>1 ธันวาคม 58</td> <td>B1 1D, 2B,C</td> <td>MC (11/3/58) 2AD</td> </tr> <tr> <td>2. ชั้น 3-4 (TASK)</td> <td>139,000,000</td> <td>10</td> <td>2 ตุลาคม 57</td> <td>1 สิงหาคม 58</td> <td>3, 4C</td> <td>4ABD</td> </tr> <tr> <td>3. ชั้น 5-7 (KANOK)</td> <td>157,000,000</td> <td>13</td> <td>6 มกราคม 58</td> <td>5 กุมภาพันธ์ 59</td> <td>5C, 7C</td> <td>7ABD</td> </tr> <tr> <td>4. ชั้น 8-10 (R&T)</td> <td>174,000,000</td> <td>13</td> <td>6 มกราคม 58</td> <td>5 กุมภาพันธ์ 59</td> <td>8C, 10ACD</td> <td>10B</td> </tr> <tr> <td>5. ชั้น 11-14 (KANOK)</td> <td>215,000,000</td> <td>14</td> <td>6 มกราคม 58</td> <td>5 มีนาคม 59</td> <td>12, 13</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6. ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)</td> <td>260,000,000</td> <td>15</td> <td>26 กันยายน 57</td> <td>25 ธันวาคม 58</td> <td></td> <td>15 (13/3/58) 21</td> </tr> <tr> <td>7. ชั้น 17-20 (BKD)</td> <td>202,000,000</td> <td>13</td> <td>26 กันยายน 57</td> <td>25 ตุลาคม 58</td> <td>17, 19, 20AB</td> <td>18 (13/3/58)</td> </tr> <tr> <td>8. ชั้น 25-28 (SRITHAI)</td> <td>175,000,000</td> <td>13</td> <td>2 ตุลาคม 57</td> <td>1 พฤศจิกายน 58</td> <td>25, 26</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานเพิ่มเติมให้ทราบว่า จะต้องเร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานชั้น 20C เพื่อส่งมอบให้เข้าทำงานตกแต่งภายในโดยเร็ว เนื่องจากมีผลกับการย้ายหน่วยงานใน ตึกกสิกรไทย - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานตกแต่งภายใน ดังนี้ <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ชั้น 20C => หลังจบ 55% - ชั้น 20B => หลังจบ 100%</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 30C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบไฟฟ้า และกำลังดำเนินการเองให้จบปฏิบัติการ (2%)</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 14C => หลังจบ 57% แต่กำลังก่อสร้างถังน้ำ 4 PU</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 3C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%) และให้ช่างช่วยงานชั้น 5 PC</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 8C, 10ACD => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%)</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 12, 13 => กำลังก่อสร้างผนังและระบบงานที่เสร็จ</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 17 => หลังจบ 55% - ชั้น 19 => หลังจบ 45%</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 20 => หลังจบ 57% - ชั้น 26C => รับจ้างก่อสร้างเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>ชั้น 25 => หลังจบ 60% - ชั้น 26 => หลังจบ 55%</td> </tr> <tr> <td>นัดมอบตัวครบรอบ วันที่ 10 มีนาคม 2558</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมรับทราบ 	โครงการ	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	จำนวน (เดือน)	ระยะเวลา		รับมอบพื้นที่		เริ่มงาน	วันสิ้นสุด	รับแล้ว	เตรียม	1. ชั้น B1-2 (TASK)	182,000,000	14	2 ตุลาคม 57	1 ธันวาคม 58	B1 1D, 2B,C	MC (11/3/58) 2AD	2. ชั้น 3-4 (TASK)	139,000,000	10	2 ตุลาคม 57	1 สิงหาคม 58	3, 4C	4ABD	3. ชั้น 5-7 (KANOK)	157,000,000	13	6 มกราคม 58	5 กุมภาพันธ์ 59	5C, 7C	7ABD	4. ชั้น 8-10 (R&T)	174,000,000	13	6 มกราคม 58	5 กุมภาพันธ์ 59	8C, 10ACD	10B	5. ชั้น 11-14 (KANOK)	215,000,000	14	6 มกราคม 58	5 มีนาคม 59	12, 13	1	6. ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)	260,000,000	15	26 กันยายน 57	25 ธันวาคม 58		15 (13/3/58) 21	7. ชั้น 17-20 (BKD)	202,000,000	13	26 กันยายน 57	25 ตุลาคม 58	17, 19, 20AB	18 (13/3/58)	8. ชั้น 25-28 (SRITHAI)	175,000,000	13	2 ตุลาคม 57	1 พฤศจิกายน 58	25, 26	27	ชั้น 20C => หลังจบ 55% - ชั้น 20B => หลังจบ 100%	ชั้น 30C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบไฟฟ้า และกำลังดำเนินการเองให้จบปฏิบัติการ (2%)	ชั้น 14C => หลังจบ 57% แต่กำลังก่อสร้างถังน้ำ 4 PU	ชั้น 3C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%) และให้ช่างช่วยงานชั้น 5 PC	ชั้น 8C, 10ACD => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%)	ชั้น 12, 13 => กำลังก่อสร้างผนังและระบบงานที่เสร็จ	ชั้น 17 => หลังจบ 55% - ชั้น 19 => หลังจบ 45%	ชั้น 20 => หลังจบ 57% - ชั้น 26C => รับจ้างก่อสร้างเสร็จ	ชั้น 25 => หลังจบ 60% - ชั้น 26 => หลังจบ 55%	นัดมอบตัวครบรอบ วันที่ 10 มีนาคม 2558	info
โครงการ	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)				จำนวน (เดือน)	ระยะเวลา		รับมอบพื้นที่																																																																							
		เริ่มงาน	วันสิ้นสุด	รับแล้ว		เตรียม																																																																									
1. ชั้น B1-2 (TASK)	182,000,000	14	2 ตุลาคม 57	1 ธันวาคม 58	B1 1D, 2B,C	MC (11/3/58) 2AD																																																																									
2. ชั้น 3-4 (TASK)	139,000,000	10	2 ตุลาคม 57	1 สิงหาคม 58	3, 4C	4ABD																																																																									
3. ชั้น 5-7 (KANOK)	157,000,000	13	6 มกราคม 58	5 กุมภาพันธ์ 59	5C, 7C	7ABD																																																																									
4. ชั้น 8-10 (R&T)	174,000,000	13	6 มกราคม 58	5 กุมภาพันธ์ 59	8C, 10ACD	10B																																																																									
5. ชั้น 11-14 (KANOK)	215,000,000	14	6 มกราคม 58	5 มีนาคม 59	12, 13	1																																																																									
6. ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)	260,000,000	15	26 กันยายน 57	25 ธันวาคม 58		15 (13/3/58) 21																																																																									
7. ชั้น 17-20 (BKD)	202,000,000	13	26 กันยายน 57	25 ตุลาคม 58	17, 19, 20AB	18 (13/3/58)																																																																									
8. ชั้น 25-28 (SRITHAI)	175,000,000	13	2 ตุลาคม 57	1 พฤศจิกายน 58	25, 26	27																																																																									
ชั้น 20C => หลังจบ 55% - ชั้น 20B => หลังจบ 100%																																																																															
ชั้น 30C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบไฟฟ้า และกำลังดำเนินการเองให้จบปฏิบัติการ (2%)																																																																															
ชั้น 14C => หลังจบ 57% แต่กำลังก่อสร้างถังน้ำ 4 PU																																																																															
ชั้น 3C => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%) และให้ช่างช่วยงานชั้น 5 PC																																																																															
ชั้น 8C, 10ACD => มีข้อสงสัยเรื่องโครงสร้างและระบบปรับอากาศ (2%)																																																																															
ชั้น 12, 13 => กำลังก่อสร้างผนังและระบบงานที่เสร็จ																																																																															
ชั้น 17 => หลังจบ 55% - ชั้น 19 => หลังจบ 45%																																																																															
ชั้น 20 => หลังจบ 57% - ชั้น 26C => รับจ้างก่อสร้างเสร็จ																																																																															
ชั้น 25 => หลังจบ 60% - ชั้น 26 => หลังจบ 55%																																																																															
นัดมอบตัวครบรอบ วันที่ 10 มีนาคม 2558																																																																															

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558



วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 5 ของ 11

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
3.3.	งานทางเดินเชื่อม - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 (จากอาคารอุปการ เวชชกิจ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก) ว่าขณะนี้ได้อนุมัติจ้าง ITD วงเงิน 200 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน - PMC รายงานเพิ่มเติม ว่า ITD ขอให้ส่งมอบพื้นที่อาคารอบรมวิชาการ ภายใน 3 เดือน และอาคารรพชริฎาณ-สามัคคีพยาบาล อาคารประสิทธิ์-ตุ้ พร้อมพันธุ์ อาคารธนาคารกสิกรไทย ภายใน 6 เดือน - ที่ประชุมรับทราบ	Info 
3.4	การบริหารจัดการอาคาร FMU รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้การจ้างดูแลรักษาความสะอาด และรักษาความ ปลอดภัย อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ระยะเวลาจ้างบริการ 3 ปี - ที่ประชุมรับทราบ	Info
4.	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว	
4.1	การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร	Info
		
เฟสที่ 1	ตึกอำนวยการ-สามัคคี-พยาบาล อีกประสิทธิ์-ตุ้-พร้อมพันธุ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย	มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
เฟสที่ 2	ตึกหลุมซิลัน ตึกวชิราวุธ ตึกอายุรศาสตร์	พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558
เฟสที่ 3	หน่วยสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโลหิต ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
เฟสที่ 4	ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลย ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธ ศูนย์อุบัติเหตุ	สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559
เฟสที่ 5	หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด	พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 6 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																
	<ul style="list-style-type: none"> - FMU แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เส้นทางขนส่งในขณะเปิดใช้อาคาร เฟสที่ 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากมีลิฟต์บางชุดไม่สามารถใช้งานได้ กล่าวคือจะใช้ลิฟต์ส่วนศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไปยังชั้น 12 และผ่านเข้าพื้นที่ไปยังลิฟต์ส่วนรักษาพยาบาลรวม เพื่อขึ้นไปยังส่วนหอผู้ป่วย โดยใช้ลิฟต์ L4-L7 แทน Bed Lift ที่ใช้งานไม่ได้ และอาจจำเป็นต้องใช้เส้นทางในการขนส่งอาหารจากทางเข้าด้านถนนราชดำริ - FMU แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ด้านความปลอดภัยในการเปิดใช้งานเฟสที่ 1 จะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆ และมี CCTV โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่ชั้น B1 - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการเข้าใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดในตารางข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาความพร้อมโดยภาพรวมให้ครบทุกด้าน ทั้งส่วนของ การเตรียมทางเข้าออก งาน IT อุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - ที่ประชุมรับทราบ 																																	
	<p>4.2 ห้องอ่านหนังสือ และนอนเวร ชั้น 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลการใช้ห้องอ่านหนังสือ (Common room) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ภาควิชา</th> <th>ห้องที่ใช้งาน</th> <th>ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ศัลยศาสตร์</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>โสต คอ นาสิกวิทยา</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จักษุวิทยา</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 3</td> <td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ออร์โธปิดิกส์</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 5</td> <td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>อายุรศาสตร์</td> <td>ห้องอ่านหนังสือ 6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>รังสีวิทยา</td> <td>ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?</td> <td>รับไว้พิจารณา</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557	1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-	2	โสต คอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-	3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-	5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-	8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา	Info
ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557																															
1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-																															
2	โสต คอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-																															
3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-																															
5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-																															
8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา																															
	<ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานให้ทราบ ความคืบหน้าในการทบทวนแบบห้องอ่านหนังสือ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายจักษุวิทยา ได้ยืนยันรูปแบบงานตกแต่งภายในห้องอ่านหนังสือที่ผู้ออกแบบ (LIDG) ได้แก้ไขมาให้ เรียบร้อยแล้ว 2. ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อยู่ระหว่างการพิจารณา รูปแบบงานตกแต่งภายในห้องอ่านหนังสือที่ผู้ออกแบบ (LIDG) ได้แก้ไขมาให้ - ที่ประชุมรับทราบ 																																	

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 7 ของ 11

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																										
	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลจากหนังสือแจ้งความต้องการใช้ห้องนอนเวรของหน่วยงานต่างๆ สรุปดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน/ภาควิชา</th> <th>จำนวน (คน)</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ศัลยศาสตร์</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>โสต ศอ นาสิกวิทยา</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>จักษุวิทยา</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ออร์โธปิดิกส์</td> <td>6</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>อายุรศาสตร์</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>รังสีวิทยา</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>วิสัญญีวิทยา</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ฝ่ายการพยาบาล</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. กลุ่มห้องผ่าตัด</td> <td>41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้</td> <td>263</td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>453</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ	ศัลยศาสตร์	64		โสต ศอ นาสิกวิทยา	5		จักษุวิทยา	4		สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5		ออร์โธปิดิกส์	6	✓	อายุรศาสตร์	20		รังสีวิทยา	12		วิสัญญีวิทยา	5		ฝ่ายการพยาบาล			1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41		2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28		3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263		รวม	453		
หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ																																										
ศัลยศาสตร์	64																																											
โสต ศอ นาสิกวิทยา	5																																											
จักษุวิทยา	4																																											
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5																																											
ออร์โธปิดิกส์	6	✓																																										
อายุรศาสตร์	20																																											
รังสีวิทยา	12																																											
วิสัญญีวิทยา	5																																											
ฝ่ายการพยาบาล																																												
1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41																																											
2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28																																											
3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263																																											
รวม	453																																											

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
 การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
 ทีมก่อสร้างอาคาร
 ครั้งที่ 26/2558

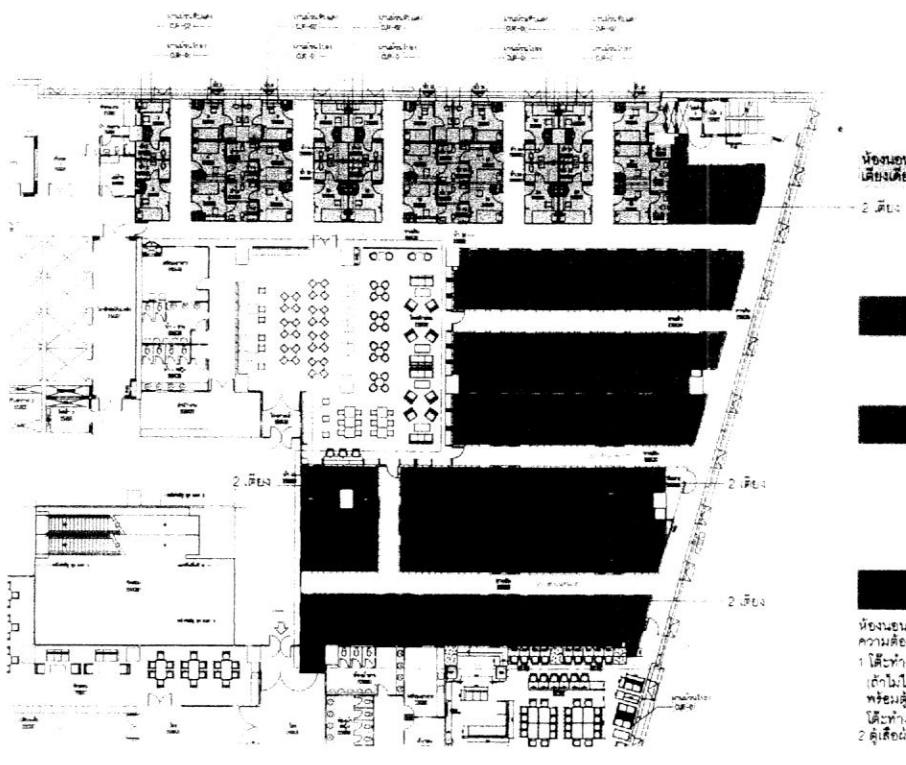
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 8 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ								
	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลจำนวนห้องนอนแวน ชั้น 11 ทั้งหมดมี 67 ห้อง รองรับได้ 147 คน แบ่งเป็นดังนี้ <table data-bbox="430 672 925 896"> <tr> <td>ห้อง 1 เตียง 25 ห้อง</td> <td>รองรับได้ 25 คน</td> </tr> <tr> <td>ห้อง 2 เตียง 21 ห้อง</td> <td>รองรับได้ 42 คน</td> </tr> <tr> <td>ห้อง 3 เตียง 4 ห้อง</td> <td>รองรับได้ 12 คน</td> </tr> <tr> <td>ห้อง 4 เตียง 17 ห้อง</td> <td>รองรับได้ 68 คน</td> </tr> </table> 	ห้อง 1 เตียง 25 ห้อง	รองรับได้ 25 คน	ห้อง 2 เตียง 21 ห้อง	รองรับได้ 42 คน	ห้อง 3 เตียง 4 ห้อง	รองรับได้ 12 คน	ห้อง 4 เตียง 17 ห้อง	รองรับได้ 68 คน	
ห้อง 1 เตียง 25 ห้อง	รองรับได้ 25 คน									
ห้อง 2 เตียง 21 ห้อง	รองรับได้ 42 คน									
ห้อง 3 เตียง 4 ห้อง	รองรับได้ 12 คน									
ห้อง 4 เตียง 17 ห้อง	รองรับได้ 68 คน									

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
 การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
 ทีมก่อสร้างอาคาร
 ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 9 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																																																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลห้องพักแพทย์ / ห้องเรียนแพทย์ ชั้น 15 28 <p style="text-align: right;">วันที่ 9 มีนาคม 2558</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ชั้นที่</th> <th colspan="3">ห้องพักแพทย์ 1</th> <th rowspan="2">ห้องพักแพทย์ 2 (3.4x8.5) = 29 ตรว.</th> <th rowspan="2">ห้องเรียนแพทย์ 1 (3.6x7.6) = 27 ตรว.</th> <th rowspan="2">ห้องเรียนแพทย์ 2 (4x7.6) = 30 ตรว.</th> </tr> <tr> <th>ใบปลิวห้องนอน 175 (6x8.6=61 ตรว.)</th> <th>ห้องนอนรวม 2 ห้อง (6x8.6=51 ตรว.) (4 คน)</th> <th>ห้องนอนรวม 3 ห้อง (3.4x8.6=88 ตรว.) (10 คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td></td> <td>ENT - 2 ห้อง</td> <td></td> <td>EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนรวม</td> <td>ENT</td> <td>EYE</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>SURG - 2 *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td>MED - 8 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td>MED - 16 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td>MED - 12 คน Ortho 2 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td>ENT - 1-2 ห้อง ORTHO - 6 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓ ฝายการพยาบาล</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td>SURG - 4 คน MED - 4 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓ ฝายการพยาบาล</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td>MED - 8 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td>MED - 12 คน</td> <td></td> <td></td> <td>✓ ฝายการพยาบาล</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MED - 12 คน</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>หน่วยงานที่ส่ง</th> <th>หน่วยงานรับ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>ศูนย์วิจัยสุขภาพ</td> <td>ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียง / คือห้อง วิสิ - 12 คน</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ห้องคลอด</td> <td>ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียงคือห้อง OB - 3 คน</td> </tr> </tbody> </table>	ชั้นที่	ห้องพักแพทย์ 1			ห้องพักแพทย์ 2 (3.4x8.5) = 29 ตรว.	ห้องเรียนแพทย์ 1 (3.6x7.6) = 27 ตรว.	ห้องเรียนแพทย์ 2 (4x7.6) = 30 ตรว.	ใบปลิวห้องนอน 175 (6x8.6=61 ตรว.)	ห้องนอนรวม 2 ห้อง (6x8.6=51 ตรว.) (4 คน)	ห้องนอนรวม 3 ห้อง (3.4x8.6=88 ตรว.) (10 คน)	16		ENT - 2 ห้อง		EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนรวม	ENT	EYE	17	SURG - 2 *						18		MED - 8 คน					19		MED - 16 คน					20		MED - 12 คน Ortho 2 คน					21		ENT - 1-2 ห้อง ORTHO - 6 คน					22							23						✓ ฝายการพยาบาล	24							25		SURG - 4 คน MED - 4 คน				✓ ฝายการพยาบาล	26							27			MED - 8 คน				28			MED - 12 คน			✓ ฝายการพยาบาล				MED - 12 คน				วันที่	หน่วยงานที่ส่ง	หน่วยงานรับ	2	ศูนย์วิจัยสุขภาพ	ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียง / คือห้อง วิสิ - 12 คน	9	ห้องคลอด	ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียงคือห้อง OB - 3 คน	
ชั้นที่	ห้องพักแพทย์ 1			ห้องพักแพทย์ 2 (3.4x8.5) = 29 ตรว.	ห้องเรียนแพทย์ 1 (3.6x7.6) = 27 ตรว.				ห้องเรียนแพทย์ 2 (4x7.6) = 30 ตรว.																																																																																																														
	ใบปลิวห้องนอน 175 (6x8.6=61 ตรว.)	ห้องนอนรวม 2 ห้อง (6x8.6=51 ตรว.) (4 คน)	ห้องนอนรวม 3 ห้อง (3.4x8.6=88 ตรว.) (10 คน)																																																																																																																				
16		ENT - 2 ห้อง		EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนรวม	ENT	EYE																																																																																																																	
17	SURG - 2 *																																																																																																																						
18		MED - 8 คน																																																																																																																					
19		MED - 16 คน																																																																																																																					
20		MED - 12 คน Ortho 2 คน																																																																																																																					
21		ENT - 1-2 ห้อง ORTHO - 6 คน																																																																																																																					
22																																																																																																																							
23						✓ ฝายการพยาบาล																																																																																																																	
24																																																																																																																							
25		SURG - 4 คน MED - 4 คน				✓ ฝายการพยาบาล																																																																																																																	
26																																																																																																																							
27			MED - 8 คน																																																																																																																				
28			MED - 12 คน			✓ ฝายการพยาบาล																																																																																																																	
			MED - 12 คน																																																																																																																				
วันที่	หน่วยงานที่ส่ง	หน่วยงานรับ																																																																																																																					
2	ศูนย์วิจัยสุขภาพ	ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียง / คือห้อง วิสิ - 12 คน																																																																																																																					
9	ห้องคลอด	ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียงคือห้อง OB - 3 คน																																																																																																																					
	<p>PMC รายงานให้ทราบว่า ได้รับข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ตามตารางข้างต้น</p>																																																																																																																						

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
 การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
 ทีมก่อสร้างอาคาร
 ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 10 ของ 11

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมเห็นว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความตกลงการไปจากเดิม ขอให้หน่วยงานช่วยแจ้งเป็นทางการ - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การบริหารจัดการห้องนอนเวรนั้น อาจจะต้องมี 2 รูปแบบรวมกัน คือ (1) กำหนดห้องที่แน่นอนให้บางฝ่ายที่จำเป็น เช่น วิสัญญี ศัลยศาสตร์ (2) ห้องที่เหลืออาจจะบริหารในรูปแบบโฮสเทล ทั้งนี้จะต้องนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือ แล้วหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง ร่วมกับ FMC - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้ ของพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่อยู่เวร อาจต้องจัดหาห้องนอนเวร ในพื้นที่อื่นภายนอกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เนื่องจากมีจำนวนมากว่าที่ในอาคารจะรองรับได้ - ฝ่ายจักษุวิทยา ให้ข้อมูลทราบว่า แพทย์ที่ใช้ห้องนอนเวร ของฝ่ายจักษุวิทยานั้น จะมีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัวด้วย ขอให้ช่วยพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วย 	
5.	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>5.1 การย้ายหอผู้ป่วยในตึกวชิรญาณวงศ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า หอผู้ป่วยในตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 3, 4 จะย้ายเข้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ชั้น 28C และจะต้องมีการปรับแบบงานตกแต่งภายใน ให้เป็นห้อง 2 เตียง ซึ่งมีกำหนดเข้าดูพื้นที่ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นี้ - ที่ประชุมรับทราบ <p>5.2 การจัดเตรียมแก๊สออกซิเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การจัดซื้อแก๊สออกซิเจน ทีมงานด้านสนับสนุนบริการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะจัดซื้อ 3 ปี และให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการตั้งสถานี ซึ่งอยู่ที่หน้าตึกคัคณางค์ บริเวณร้าน Seven Eleven และติดตั้งท่อตามแนวทางเดินเชื่อมไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ - FMU แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ชั้นใต้ดิน (B4) จะมี Mainiflow ซึ่งจะสำรองการจ่ายแก๊สออกซิเจน - ที่ประชุมรับทราบ 	Info

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 26/2558

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 11 ของ 11

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
5.3	<p>ความต้องการแก้ไขและเพิ่มเติมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ของหน่วยงานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับทราบความต้องการแก้ไขงาน ของหน่วยงานต่างๆ แล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา และร่วมหาแนวทางในการแก้ไข (1) ประตูห้องน้ำ ในห้องพักผู้ป่วย 4 เตียง ที่มีแคบไม่สะดวกกับการใช้งานของผู้ป่วย (2) ความสูงของโถส้วมที่ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ และความสูงของกระจกเงา ของออร์โธปิดิกส์ <p style="text-align: center;">แก้ไขแล้ว</p>	✓ ✓
6.	<p>กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ (ห้องเล็ก) ตึก ภปร ชั้น 18 	ทุกฝ่าย

1- 29 กพ 58 นายจิว Ortho พัดธง 0460
 ป้ายผนัง 81 11-12 (wall (bed 58))
 ของ พัดธงงาน นิต ของ ใน กพพต 58
 5 12 กพ 58
 5 12 กพ 58
