

ด่วนที่สุด

สภากาชาดไทย

Fo. 3.6

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

อ. นพ. จิรินทร์ ประจักษ์

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 28/2558 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 27/2558

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหาร โครงการฯ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว



(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---|---|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ | กรรมการ |
| 8. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เกษจรสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | กรรมการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา | กรรมการ |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา | กรรมการ |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา | กรรมการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา | กรรมการ |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร | กรรมการ |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ | กรรมการ |
| 19. น.ส.พัชรา ดุลยสินพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 20. น.ส.วรมน เดชมหาวิพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 21. น.ส.จิตรา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุภวัฒน์ ชูติวงศ์ | ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม | (เชิญพิเศษ) |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง | (เชิญพิเศษ) |
| 25. คุณครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ | (เชิญพิเศษ) |

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 028/2558

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27/2558

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้างอาคาร
3.2 งานตกแต่งภายใน
3.3 งานทางเดินเชื่อม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ PMO ครั้งที่ 027/2558
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมณมณฑลภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายเซ็น
1.	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	[ลายเซ็น]
2.	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศจุฑาธุช (รองคณบดีฝ่ายวัดกรรมกรศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์	[ลายเซ็น] (11/11/58)
11.	หัวหน้าฝ่ายเกษตรศาสตร์	[ลายเซ็น] (11/11/58)
12.	หัวหน้าฝ่ายดุริยางค์-นริยวิทยา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	[ลายเซ็น] (11/11/58)
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
16.	หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร	[ลายเซ็น] (11/11/58)
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	[ลายเซ็น] (11/11/58)
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	[ลายเซ็น] (11/11/58)
21.	น.ส. พัชรา ดุลยสินพวงศ์	[ลายเซ็น] (11/11/58)
22.	น.ส. วรมน เดชมหาวิพงศ์	
23.	น.ส. จิตรา จันชนะกิจ	
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา	[ลายเซ็น] (11/11/58)
25.	นายณกมล บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	นายครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ	
28.	นายณพรรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายโอภาส สกุลศิริกมล ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	[ลายเซ็น] (11/11/58)
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 027/2558

วันที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเล็ก ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 10

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26/2558
- วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- 3.1 งานก่อสร้างอาคาร
 - 3.2 งานตกแต่งภายใน
 - 3.3 งานทางเดินเชื่อม
- วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
 - 4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
1.	<p>เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานฯ แจ้งกำหนดการใช้พื้นที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ให้ทราบ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 จะจัดงานประชุม ASEAN Active Ageing โดยใช้พื้นที่โถงชั้น 1 พื้นที่ชั้น 12 และชั้น 13 ซึ่งเป็นห้องประชุม 350 คน ห้องประชุม 200 คน (2 ห้อง) ห้องประชุม 120 คน (2 ห้อง) และห้องประชุม 100 คน และห้องอาหารเจ้าหน้าที่ ฯลฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะจัดงานทำบุญครบรอบ 101 ปี โดยใช้พื้นที่โถงชั้น 1 พื้นที่ชั้น 13 (ห้องอาหารเจ้าหน้าที่) ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจัดหาทุนฯ จะปิดโครงการระดมทุน วันที่ 23 เมษายน 2558 แต่การบริจาคมายังคงรับบริจาคตามปกติ และได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้บริจาคเพื่อจารึกไว้ที่อาคารแล้ว 	Info
2.	<p>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26/2558</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 26/2558 	.
3.	<p>ความก้าวหน้าของงาน</p> <p>3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 98.45% เป็นไปตามแผนงานเมื่อเทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 PMC รายงานเพิ่มเติมว่า งานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม (484 ล้านบาท) ดำเนินการไปแล้ว 98% ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร (ITD) จะส่งมอบอาคาร ภายใน 30 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นอาคารจะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี PCS เป็นผู้บริหารจัดการอาคาร และขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการจัดทำประกันภัย PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมผลงาน 92% โดยสถานะการติดตั้ง(ทั้งหมด 53 ชุด) มีลิฟต์ที่ทดสอบแล้ว 33 ชุด อยู่ระหว่างทดสอบ 9 ชุด และอยู่ระหว่างการติดตั้ง 1 ชุด ส่วนบันไดเลื่อนอยู่ระหว่างการทดสอบ 6 ชุด 	Info

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 5 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																																																																
	<p>3.3. งานทางเดินเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none">- PMC รายงานความก้าวหน้าของงานทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 (จากอาคารอุปการเวชกิจ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก) ว่าขณะนี้ได้อนุมัติจ้าง ITD วงเงิน 200 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี- PMC รายงานเพิ่มเติม ว่า ITD ขอให้ส่งมอบพื้นที่อาคารอบรมวิชาการ ภายใน 3 เดือน และอาคารวิทยุ-สมาคมศิษย์พยาบาล อาคารประสิทธิ์-ตุ้ พร้อมพันธุ์ อาคารธนาคารกสิกรไทย ภายใน 6 เดือน- ที่ประชุมรับทราบ <p>3.4 การบริหารจัดการอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none">- FMU รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้การจ้างดูแลรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ได้จัดทำ TOR ระยะเวลาจ้างบริการ 3 ปี แล้ว ทั้งนี้จะดำเนินการจ้างเข้ามาทำงานช่วงแรก 3-4 เดือน ก่อน เพื่อให้ทันการเข้าใช้งานในเฟสที่ 1- FMU รายงานเพิ่มเติมให้ทราบว่า ในเดือนเมษายน 2558 จะมีการจัดอบรม เรื่องการป้องกันอัคคีภัย- ที่ประชุมรับทราบ	<p>Info</p> <p>Info</p>																																																																																
4.	<p>เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>4.1 การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร</p>	<p>Info</p>																																																																																
	<table><tr><th>เฟส / หน่วยงานที่ย้าย</th><th>กำหนดเดิม</th><th>แนวใหม่การย้าย เข้าใช้งาน</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>เฟสที่ 1 ตึกวิทยุ-สมาคมศิษย์พยาบาล</td><td>เมษายน 58</td><td>3-30 มิถุนายน 58</td><td>Nephro. Lab (16 ส.ค. 58).</td></tr><tr><td>ตึกอบรมวิชาการ</td><td>พฤษภาคม 58</td><td>1-15 กรกฎาคม 58</td><td></td></tr><tr><td>ตึกประสิทธิ์-ตุ้พร้อมพันธุ์</td><td></td><td>16 กรกฎาคม 58-15 สิงหาคม 58</td><td>GI Pendant(ส.ค. 58).</td></tr><tr><td>ตึกธนาคารกสิกรไทย</td><td>มิถุนายน 58</td><td>16-31 สิงหาคม 58</td><td>BM Ward (ส.ค.58).</td></tr><tr><td>เฟสที่ 2 ตึกหัตถ์ฉีดยา ตึกวิชาเวช/ICU.med.</td><td>สิงหาคม - ตุลาคม 58</td><td>16-31 สิงหาคม 58</td><td>ICU pendant (ก.ย. 58).</td></tr><tr><td>ตึกอายุรศาสตร์</td><td></td><td>16-31 สิงหาคม 58</td><td>Rhumsato (16 พ.ย. 58).</td></tr><tr><td>เฟสที่ 3 รังสีวิทยา</td><td>สิงหาคม 58 – มกราคม 59</td><td>16 สิงหาคม – 30 กันยายน 58</td><td></td></tr><tr><td>จุฬารังสีวิทยา ภาควิชาเลือด เวชศาสตร์ชั้นสูง</td><td></td><td>1-31 ตุลาคม 58</td><td></td></tr><tr><td>เภสัชกรรมผู้ป่วยใน TSSU</td><td></td><td>1-31 ตุลาคม 58</td><td></td></tr><tr><td>วิสัญญี ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโลหฯ</td><td></td><td>16-30 ธันวาคม 58</td><td>Ward (16 ก.ย. 58).</td></tr><tr><td>ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ</td><td></td><td>16-30 ธันวาคม 58</td><td>Ward (16 พ.ค. 59).</td></tr><tr><td>ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ</td><td></td><td>16-31 มกราคม 59</td><td>Ward, OR GYN (16 ธ.ค. 58).</td></tr><tr><td>เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ</td><td>ตุลาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59</td><td>16-31 มกราคม 59</td><td>Eq. CAT11 (ธ.ค. 58).</td></tr><tr><td>ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออโรโธฯ</td><td></td><td>1-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td>Ward (1 ธ.ค. 58).</td></tr><tr><td>ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ</td><td></td><td>1-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td>Ward (16 ส.ค. ม.ค. 59).</td></tr><tr><td>ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา /</td><td></td><td>16-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td>Ward (15 ม.ค. 59).</td></tr><tr><td>ห้องยาผู้ป่วยนอก</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>เฟสที่ 5 เวชศาสตร์ฟื้นฟู</td><td>มกราคม – กุมภาพันธ์ 59</td><td>16-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td></td></tr><tr><td>การศึกษา</td><td></td><td>16-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td></td></tr></table>	เฟส / หน่วยงานที่ย้าย	กำหนดเดิม	แนวใหม่การย้าย เข้าใช้งาน	หมายเหตุ	เฟสที่ 1 ตึกวิทยุ-สมาคมศิษย์พยาบาล	เมษายน 58	3-30 มิถุนายน 58	Nephro. Lab (16 ส.ค. 58).	ตึกอบรมวิชาการ	พฤษภาคม 58	1-15 กรกฎาคม 58		ตึกประสิทธิ์-ตุ้พร้อมพันธุ์		16 กรกฎาคม 58-15 สิงหาคม 58	GI Pendant(ส.ค. 58).	ตึกธนาคารกสิกรไทย	มิถุนายน 58	16-31 สิงหาคม 58	BM Ward (ส.ค.58).	เฟสที่ 2 ตึกหัตถ์ฉีดยา ตึกวิชาเวช/ICU.med.	สิงหาคม - ตุลาคม 58	16-31 สิงหาคม 58	ICU pendant (ก.ย. 58).	ตึกอายุรศาสตร์		16-31 สิงหาคม 58	Rhumsato (16 พ.ย. 58).	เฟสที่ 3 รังสีวิทยา	สิงหาคม 58 – มกราคม 59	16 สิงหาคม – 30 กันยายน 58		จุฬารังสีวิทยา ภาควิชาเลือด เวชศาสตร์ชั้นสูง		1-31 ตุลาคม 58		เภสัชกรรมผู้ป่วยใน TSSU		1-31 ตุลาคม 58		วิสัญญี ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโลหฯ		16-30 ธันวาคม 58	Ward (16 ก.ย. 58).	ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ		16-30 ธันวาคม 58	Ward (16 พ.ค. 59).	ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ		16-31 มกราคม 59	Ward, OR GYN (16 ธ.ค. 58).	เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ	ตุลาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59	16-31 มกราคม 59	Eq. CAT11 (ธ.ค. 58).	ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออโรโธฯ		1-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (1 ธ.ค. 58).	ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ		1-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (16 ส.ค. ม.ค. 59).	ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา /		16-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (15 ม.ค. 59).	ห้องยาผู้ป่วยนอก				เฟสที่ 5 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	มกราคม – กุมภาพันธ์ 59	16-29 กุมภาพันธ์ 59		การศึกษา		16-29 กุมภาพันธ์ 59		
เฟส / หน่วยงานที่ย้าย	กำหนดเดิม	แนวใหม่การย้าย เข้าใช้งาน	หมายเหตุ																																																																															
เฟสที่ 1 ตึกวิทยุ-สมาคมศิษย์พยาบาล	เมษายน 58	3-30 มิถุนายน 58	Nephro. Lab (16 ส.ค. 58).																																																																															
ตึกอบรมวิชาการ	พฤษภาคม 58	1-15 กรกฎาคม 58																																																																																
ตึกประสิทธิ์-ตุ้พร้อมพันธุ์		16 กรกฎาคม 58-15 สิงหาคม 58	GI Pendant(ส.ค. 58).																																																																															
ตึกธนาคารกสิกรไทย	มิถุนายน 58	16-31 สิงหาคม 58	BM Ward (ส.ค.58).																																																																															
เฟสที่ 2 ตึกหัตถ์ฉีดยา ตึกวิชาเวช/ICU.med.	สิงหาคม - ตุลาคม 58	16-31 สิงหาคม 58	ICU pendant (ก.ย. 58).																																																																															
ตึกอายุรศาสตร์		16-31 สิงหาคม 58	Rhumsato (16 พ.ย. 58).																																																																															
เฟสที่ 3 รังสีวิทยา	สิงหาคม 58 – มกราคม 59	16 สิงหาคม – 30 กันยายน 58																																																																																
จุฬารังสีวิทยา ภาควิชาเลือด เวชศาสตร์ชั้นสูง		1-31 ตุลาคม 58																																																																																
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน TSSU		1-31 ตุลาคม 58																																																																																
วิสัญญี ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโลหฯ		16-30 ธันวาคม 58	Ward (16 ก.ย. 58).																																																																															
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ		16-30 ธันวาคม 58	Ward (16 พ.ค. 59).																																																																															
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ		16-31 มกราคม 59	Ward, OR GYN (16 ธ.ค. 58).																																																																															
เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ	ตุลาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59	16-31 มกราคม 59	Eq. CAT11 (ธ.ค. 58).																																																																															
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออโรโธฯ		1-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (1 ธ.ค. 58).																																																																															
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ		1-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (16 ส.ค. ม.ค. 59).																																																																															
ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา /		16-29 กุมภาพันธ์ 59	Ward (15 ม.ค. 59).																																																																															
ห้องยาผู้ป่วยนอก																																																																																		
เฟสที่ 5 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	มกราคม – กุมภาพันธ์ 59	16-29 กุมภาพันธ์ 59																																																																																
การศึกษา		16-29 กุมภาพันธ์ 59																																																																																

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 6 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานันต์ภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																
	<ul style="list-style-type: none">- ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ได้ขอให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แจ้งคณะแพทยศาสตร์ เตรียมพื้นที่รองรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ฝึกอบรมวิชาการที่จะต้องรื้อถอนในเฟสที่ 1- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ในการย้ายเข้าใช้อาคาร แต่ละหน่วยงานสามารถเสนอแนวทางซึ่งอาจแตกต่างกันได้ เช่น ลดคนไข้ในช่วงที่มีการย้าย หรืออาจย้ายภายใน 1-2 วัน โดยไม่มีการรับคนไข้ในช่วงนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยหารือกับฝ่ายบริการ- หน่วยงานต่าง ๆ ขอให้แจ้งกำหนดการย้ายล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อม- PMC ได้รายงานสถานะกำหนดเวลาของการย้ายหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใช้งานตามตารางข้างต้น ซึ่งหากการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ที่ประชุมทราบ- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการเข้าใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดในตารางข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาความพร้อมโดยภาพรวมให้ครบทุกด้าน ทั้งส่วนของการเตรียมทางเข้าออก งาน IT การเตรียมระบบ Wifi อุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ- ที่ประชุมรับทราบ																																	
4.2	<p>ห้องอ่านหนังสือ และนอนเวร ชั้น 11</p> <ul style="list-style-type: none">● ข้อมูลการใช้ห้องอ่านหนังสือ (Common room)	Info																																
	<table><tr><th>ลำดับ</th><th>ภาควิชา</th><th>ห้องที่ใช้งาน</th><th>ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557</th></tr><tr><td>1</td><td>ศัลยศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>โสต คอ นาสิกวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 2</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>จักษุวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 3</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน (ฝ่ายจักษุทบทวนเรียบร้อยแล้ว)</td></tr><tr><td>4</td><td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 4</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 5</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td></tr><tr><td>6</td><td>อายุรศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 6</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>รังสีวิทยา</td><td>ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?</td><td>ร่วไว้พิจารณา</td></tr></table>	ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557	1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-	2	โสต คอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-	3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน (ฝ่ายจักษุทบทวนเรียบร้อยแล้ว)	4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-	5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-	8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	ร่วไว้พิจารณา	
ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557																															
1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-																															
2	โสต คอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-																															
3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน (ฝ่ายจักษุทบทวนเรียบร้อยแล้ว)																															
4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-																															
5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-																															
8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	ร่วไว้พิจารณา																															
	<ul style="list-style-type: none">- PMC รายงานให้ทราบ ความคืบหน้าในการทบทวนแบบห้องอ่านหนังสือ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">1. ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อยู่ระหว่างการพิจารณา รูปแบบงานตกแต่งภายในห้องอ่านหนังสือที่ผู้ออกแบบ (LIDG) ได้แก้ไขมาให้- ที่ประชุมรับทราบ																																	

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 7 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																										
	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลจากหนังสือแจ้งความต้องการใช้ห้องนอนเวรของหน่วยงานต่างๆ สรุปดังนี้ <table> <tr> <th>หน่วยงาน/ภาควิชา</th><th>จำนวน (คน)</th><th>หมายเหตุ</th></tr> <tr> <td>ศัลยศาสตร์</td><td>64 □</td><td></td></tr> <tr> <td>โสต ศอ นาสิกวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>จักษุวิทยา</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>อายุรศาสตร์</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>รังสีวิทยา</td><td>12</td><td></td></tr> <tr> <td>วิสัญญีวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ฝ่ายการพยาบาล</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1. กลุ่มห้องผ่าตัด</td><td>41</td><td></td></tr> <tr> <td>2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ</td><td>28</td><td></td></tr> <tr> <td>3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้</td><td>263</td><td></td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>453</td><td></td></tr> </table>	หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ	ศัลยศาสตร์	64 □		โสต ศอ นาสิกวิทยา	5		จักษุวิทยา	4		สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5		ออร์โธปิดิกส์	6		อายุรศาสตร์	20		รังสีวิทยา	12		วิสัญญีวิทยา	5		ฝ่ายการพยาบาล			1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41		2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28		3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263		รวม	453		
หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ																																										
ศัลยศาสตร์	64 □																																											
โสต ศอ นาสิกวิทยา	5																																											
จักษุวิทยา	4																																											
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5																																											
ออร์โธปิดิกส์	6																																											
อายุรศาสตร์	20																																											
รังสีวิทยา	12																																											
วิสัญญีวิทยา	5																																											
ฝ่ายการพยาบาล																																												
1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41																																											
2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28																																											
3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263																																											
รวม	453																																											

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

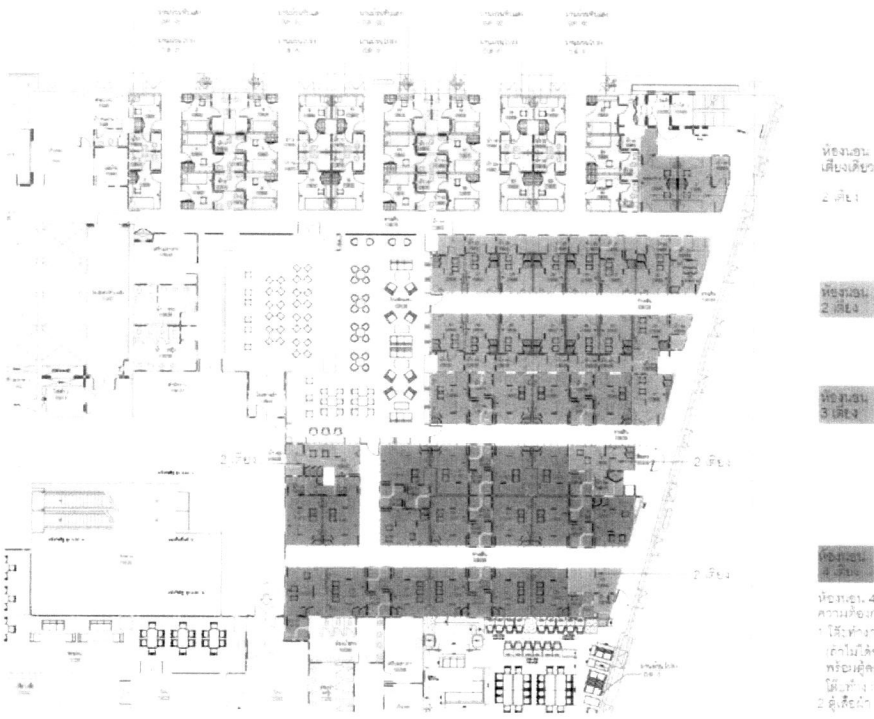
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 8 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
	<div><div><div>● ข้อมูลจำนวนห้องนอนเวร ชั้น 11 ทั้งหมดมี 67 ห้อง รองรับได้ 147 คน แบ่งเป็นดังนี้</div><div><div><div>ห้อง 1 เพียง 25 ห้อง</div><div>รองรับได้ 25 คน</div></div><div><div>ห้อง 2 เพียง 21 ห้อง</div><div>รองรับได้ 42 คน</div></div><div><div>ห้อง 3 เพียง 4 ห้อง</div><div>รองรับได้ 12 คน</div></div><div><div>ห้อง 4 เพียง 17 ห้อง</div><div>รองรับได้ 68 คน</div></div></div></div><div></div></div>	

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 27/2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 10 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
5.	เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี	Info
6.	กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป - กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเล็ก ตึกอำนวยการ ชั้น 2	ทุกฝ่าย
