

สภาวิชาชีพ

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

ด.พ. สันชัย ประจิมแทน

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 25/2557 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 24/2557

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาวิชาชีพ โดย มีผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว



(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- | | |
|---|--|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ | กรรมการ |
| 8. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เกลิษฐารักษ์ (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | กรรมการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา | กรรมการ |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา | กรรมการ |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา | กรรมการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา | กรรมการ |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง | กรรมการ |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ | กรรมการ |
| 19. น.ส.พัชรา คุณยวสินพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 20. น.ส.วรมน เดชมธาวีพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 21. น.ส.จิตรภา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ ชูติวงศ์ | ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพ (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม | (เชิญพิเศษ) |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง | (เชิญพิเศษ) |
| 25. คุณครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ | (เชิญพิเศษ) |

- อ.อ.ป., อ.นพ.ส.ก. / ส.ก.ก.

- รศ.นพ.อ.วันชัย พิทยา / ปรึกษา

1 ยศ นร

โครงการ : การประชุมคณะกรรมการทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะกรรมการทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 026/2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

3.1 งานก่อสร้างอาคาร

3.2 งานตกแต่งภายใน

3.3 งานทางเดินเชื่อม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร

4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11













วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ PMO ครั้งที่ 025/2558
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 10

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายเซ็น
1.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	
2.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เหลืองจรสุข (รองคณบดีฝ่ายวัดกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์	
11.	หัวหน้าฝ่ายอายุศาสตร์	
12.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	
16.	หัวหน้าฝ่าย โสต ศอ นาสิกวิทยา	
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง	
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
21.	น.ส.พัชรา ดุลยสินพงศ์	
22.	น.ส.วรมน เดชมธาวีพงศ์	
23.	น.ส.จิตรา จันชนะกิจ	
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา	
25.	นายณภดล บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	นายครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ	
28.	นายณพรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายโอภาส สกุลศิริกมล ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

โครงการ : การประชุมคณะกรรมการทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะกรรมการทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 025/2558

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 10

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2557
- วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- 3.1 งานก่อสร้างอาคาร
 - 3.2 งานตกแต่งภายใน
 - 3.3 งานทางเดินเชื่อม
- วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
 - 4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
1.	<p>เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ชั้น 29 จำนวน 2 ห้อง เป็นการไหม้ฉนวนกันความร้อนที่เพดาน ไม้อัดที่ติดตั้งภายในห้องไม่ไหม้ แต่เกิดควันจำนวนมาก และมีลิฟต์ที่เกิดความเสียหาย 17 ชุด ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างตกแต่งภายในชั้น 29 จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด - ประธานฯแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น พบว่า ปัญหาขณะเกิดเหตุ คือ ความไม่พร้อมในการประสานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จุดรวมพลไม้ขัดเจนตรวจเช็คจำนวน คนอพยพไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง และซ่อมกันให้เกิดความชัดเจน 	Info
2.	<p>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2557 	
3.	<p>ความก้าวหน้าของงาน</p> <p>3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 96.50% และได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป 120 วัน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) - PMC รายงานเพิ่มเติม ว่างานตามสัญญาก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมชุดที่ 1 (484 ล้านบาท) ดำเนินการไปแล้ว 91.5 % - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมผลงาน 90 % โดยสถานะการติดตั้ง(ทั้งหมด 53 ชุด) มีลิฟต์ที่ทดสอบแล้ว 20 ชุด อยู่ระหว่างทดสอบ 28 ชุด และอยู่ระหว่างการติดตั้ง 5 ชุด ส่วนบันไดเลื่อน 6 ชุด อยู่ระหว่างการทดสอบ - PMC รายงานเพิ่มเติม ว่า มีลิฟต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 29 จำนวน 17 ชุด เป็น ลิฟต์เดี่ยวที่เสียหายมาก 8 ชุด ลิฟต์โดยสารที่เสียหายปานกลาง 3 ชุด และเป็นลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิงที่เสียหายเล็กน้อย 6 ชุด - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV และ Access control) ขณะนี้กำลังเตรียมงานห้องควบคุม และ Demo ภาพมุมมองกล้อง CCTV - ที่ประชุมรับทราบ 	Info

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 4 ของ 10

ชั้น 2 C	ผลงาน 20%
ชั้น 4 C	ผลงาน 24%
ชั้น 17	ผลงาน 45%
ชั้น 19	ผลงาน 41%
ชั้น 20	ผลงาน 30%
ชั้น 25	ผลงาน 40%
ชั้น 26	ผลงาน 32%

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 5 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ															
	<p>3.3. งานออกแบบทางเดินเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none"> PMC รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 (จากอาคารอุปการเวชกิจ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ITD วงเงิน 200 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ในการก่อสร้างทางเดินเชื่อม จะต้องมีการย้ายสถานีจ่ายแก๊ส โดยตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานกายภาพได้เห็นชอบแล้ว จะอยู่ที่หน้าตึกคณบดี บริเวณร้าน Seven Eleven ที่ประชุมรับทราบ <p>3.4 การบริหารจัดการอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> PMC รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้การจ้างดูแลรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย อยู่ระหว่างจัดทำ TOR โดยศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ ที่ประชุมรับทราบ 	Info															
4.	<p>เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>4.1 การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร</p>	Info															
	<table border="1"> <tr> <td>เฟสที่ 1</td><td> <p>ตึกบริหารงาน-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย</p> </td><td> <p>มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558</p> </td></tr> <tr> <td>เฟสที่ 2</td><td> <p>ตึกหลิมซัน ตึกชีวราช ตึกอายุรศาสตร์</p> </td><td> <p>พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558</p> </td></tr> <tr> <td>เฟสที่ 3</td><td> <p>หน่วยงานสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ</p> </td><td> <p>พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558</p> </td></tr> <tr> <td>เฟสที่ 4</td><td> <p>ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุฯ</p> </td><td> <p>สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559</p> </td></tr> <tr> <td>เฟสที่ 5</td><td>หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด</td><td>พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559</td></tr> </table>	เฟสที่ 1	<p>ตึกบริหารงาน-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย</p>	<p>มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558</p>	เฟสที่ 2	<p>ตึกหลิมซัน ตึกชีวราช ตึกอายุรศาสตร์</p>	<p>พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558</p>	เฟสที่ 3	<p>หน่วยงานสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ</p>	<p>พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558</p>	เฟสที่ 4	<p>ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุฯ</p>	<p>สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559</p>	เฟสที่ 5	หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด	พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559	
เฟสที่ 1	<p>ตึกบริหารงาน-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย</p>	<p>มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558</p>															
เฟสที่ 2	<p>ตึกหลิมซัน ตึกชีวราช ตึกอายุรศาสตร์</p>	<p>พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558</p>															
เฟสที่ 3	<p>หน่วยงานสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ</p>	<p>พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558</p>															
เฟสที่ 4	<p>ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุฯ</p>	<p>สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559</p>															
เฟสที่ 5	หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด	พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559															

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 6 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																
	<ul style="list-style-type: none">- ฝ่ายการพยาบาล แจ้งให้ทราบว่า การย้ายหน่วยงาน ภปร 14-17 จะขอย้ายในเฟสที่ 4 โดย ภปร 14-15 จะไปอยู่ที่ชั้น 27 และ ภปร 16-17 จะไปอยู่ที่ชั้น 25- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายการพยาบาล ที่อยู่ตึกกวีรญาณ สามัคคี พยาบาล ชั้น 3 กำลังพิจารณาให้ย้ายไปอยู่ที่ตึกของภาควิชาสูติฯ หลังจากที่ย้ายออกประมาณต้นเดือนเมษายน 2558- ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เส้นทางขนส่งในขณะเปิดใช้อาคาร เฟสที่ 1 จะใช้ลิฟต์ส่วนบุคคลเป็นเลิศฯ ไปยังชั้น 12 และผ่านเข้าพื้นที่ไปยังลิฟต์ส่วนรักษาพยาบาลรวม เพื่อขึ้นไปยังส่วนหอผู้ป่วย- PMC รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้งานตกแต่งภายใน แต่ละเฟสมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตามแผนเดิมข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูปัญหา อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ทราบ- ที่ประชุมรับทราบ																																	
	<p>4.2 ห้องอ่านหนังสือ และนอนเวร ชั้น 11</p> <ul style="list-style-type: none">● ข้อมูลการใช้ห้องอ่านหนังสือ (Common room) <table><tr><th>ลำดับ</th><th>ภาควิชา</th><th>ห้องที่ใช้งาน</th><th>ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557</th></tr><tr><td>1</td><td>ศัลยศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>โสต ศอ นาสิกวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 2</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>จักษุวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 3</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td></tr><tr><td>4</td><td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 4</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 5</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td></tr><tr><td>6</td><td>อายุรศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 6</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>รังสีวิทยา</td><td>ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?</td><td>รับไว้พิจารณา</td></tr></table>	ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557	1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-	2	โสต ศอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-	3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-	5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-	8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา	Info
ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557																															
1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-																															
2	โสต ศอ นาสิกวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-																															
3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-																															
5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-																															
8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา																															

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 7 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																										
	<p>● ข้อมูลจากหนังสือแจ้งความต้องการใช้ห้องนอนเวรของหน่วยงานต่างๆ สรุปดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงานภาควิชา</th><th>จำนวน (คน)</th><th>หมายเหตุ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ศัลยศาสตร์</td><td>64</td><td></td></tr> <tr> <td>โสต หอ นาสิกวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>จักษุวิทยา</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>อายุรศาสตร์</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>รังสีวิทยา</td><td>12?</td><td></td></tr> <tr> <td>วิสัญญีวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ฝ่ายการพยาบาล</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1. กลุ่มห้องผ่าตัด</td><td>41</td><td></td></tr> <tr> <td>2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ</td><td>28</td><td></td></tr> <tr> <td>3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้</td><td>263</td><td></td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>466</td><td></td></tr> </tbody> </table>	หน่วยงานภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ	ศัลยศาสตร์	64		โสต หอ นาสิกวิทยา	5		จักษุวิทยา	4		สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5		ออร์โธปิดิกส์	6		อายุรศาสตร์	20		รังสีวิทยา	12?		วิสัญญีวิทยา	5		ฝ่ายการพยาบาล			1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41		2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28		3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263		รวม	466		
หน่วยงานภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ																																										
ศัลยศาสตร์	64																																											
โสต หอ นาสิกวิทยา	5																																											
จักษุวิทยา	4																																											
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5																																											
ออร์โธปิดิกส์	6																																											
อายุรศาสตร์	20																																											
รังสีวิทยา	12?																																											
วิสัญญีวิทยา	5																																											
ฝ่ายการพยาบาล																																												
1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41																																											
2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28																																											
3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263																																											
รวม	466																																											

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

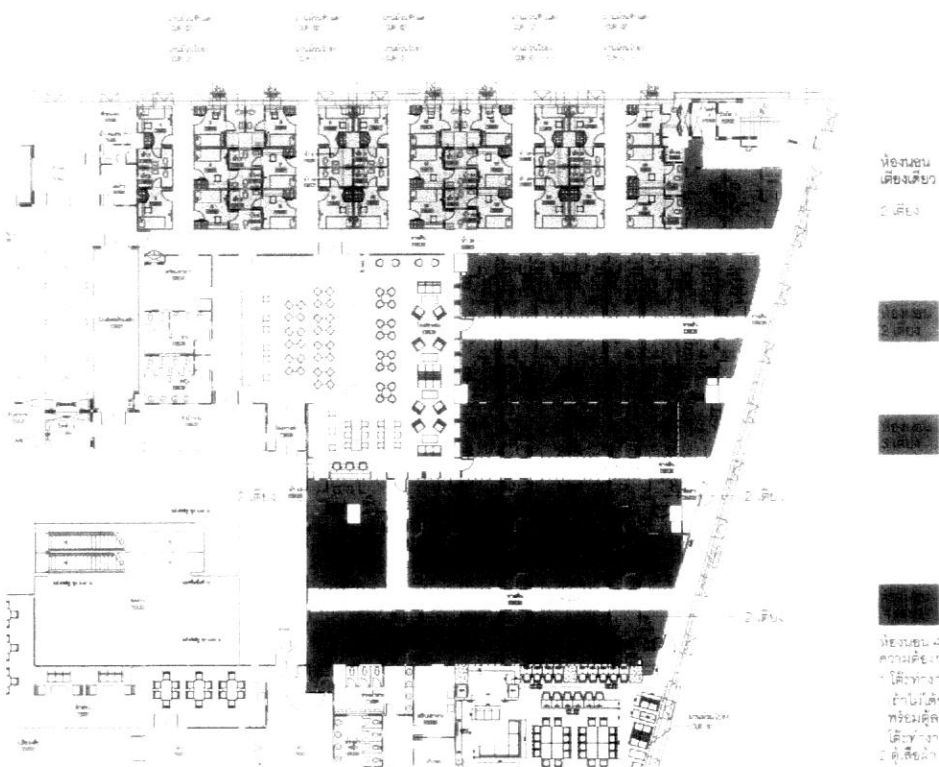
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 8 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ								
	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลจำนวนห้องนอนเวร ชั้น 11 ทั้งหมดมี 67 ห้อง รองรับได้ 147 คน แบ่งเป็น ดังนี้ <table><tr><td>ห้อง 1 เติง 25 ห้อง</td><td>รองรับได้ 25 คน</td></tr><tr><td>ห้อง 2 เติง 21 ห้อง</td><td>รองรับได้ 42 คน</td></tr><tr><td>ห้อง 3 เติง 4 ห้อง</td><td>รองรับได้ 12 คน</td></tr><tr><td>ห้อง 4 เติง 17 ห้อง</td><td>รองรับได้ 68 คน</td></tr></table>  <p>ห้องนอน เติงเดี่ยว 2 เติง</p> <p>ห้องนอน เติงเดี่ยว 3 เติง</p> <p>ห้องนอน เติงเดี่ยว 4 เติง</p> <p>ห้องนอน เติงเดี่ยว 5 เติง - โต๊ะทำงาน 3 ตัวได้ - ตู้เก็บของ 3 ตัวได้ - ตู้เก็บของ 1 ตัวได้ - ตู้เก็บของ 1 ตัวได้ - ตู้เก็บของ 1 ตัวได้</p>	ห้อง 1 เติง 25 ห้อง	รองรับได้ 25 คน	ห้อง 2 เติง 21 ห้อง	รองรับได้ 42 คน	ห้อง 3 เติง 4 ห้อง	รองรับได้ 12 คน	ห้อง 4 เติง 17 ห้อง	รองรับได้ 68 คน	
ห้อง 1 เติง 25 ห้อง	รองรับได้ 25 คน									
ห้อง 2 เติง 21 ห้อง	รองรับได้ 42 คน									
ห้อง 3 เติง 4 ห้อง	รองรับได้ 12 คน									
ห้อง 4 เติง 17 ห้อง	รองรับได้ 68 คน									

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 9 ของ 10

วาระที่

รายละเอียด

ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ

● ข้อมูลห้องพักแพทย์ / ห้องเรียนแพทย์ ชั้น 15-28

ชั้นที่	ห้องพักแพทย์ 1			ห้องพักแพทย์ 2 (3.4x8.5 = 29 m ²)	ห้องเรียนแพทย์ 1 (3.6x7.5 = 27 m ²)	ห้องเรียนแพทย์ 2 (4x7.5 = 30 m ²)
	ไม่มีห้องนอนรวม (6x8.5=51 m ²)	ห้องนอนรวม 2 ห้อง (6x8.5=51 m ²) (4 คน)	ห้องนอนรวม 3 ห้อง (9.4x8.5=80 m ²) (10 คน)			
15		ENT - 2 คน		EYE - 2 คน ปรับเปลี่ยนโหนดรวม	ENT	EYE
16	SURG 2 ?					
17		MED - 8 คน				
18		MED - 16 คน				
19		MED - 12 คน				
20			MED - 2 คน Nurse 2 คน			
21		ENT - 1 คน ORTHO - 6 คน				
22						
23						✓ ฝ่ายการพยาบาล
24	Nurse 2 คน					
25		SURG - 4 คน MED - 4 คน				✓ ฝ่ายการพยาบาล
26			MED - 8 คน			
27			MED - 12 คน			✓ ฝ่ายการพยาบาล
28			MED - 12 คน			

ชั้นที่	หน่วยงานที่ใช้งาน	ห้องนอนรวม
2	ศูนย์วินิจฉัยศักยภาพ	ห้องนอนรวม 6 ห้อง / 2 เตียง / ต่อห้อง รังสี - 12 คน
9	ห้องผลัด	ห้องนอนรวม 3 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง OB - 3 คน

- PMC รายงานให้ทราบว่า ได้รับข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ตามตารางข้างต้น

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 25/2558

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 10 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
5.	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>5.1 การย้ายหอผู้ป่วยในตึกวชิรญาณวงศ์</p> <ul style="list-style-type: none">- ที่ประชุมเห็นว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการไปจากเดิม ขอให้หน่วยงานช่วยแจ้งเป็นทางการ- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เมื่อได้ข้อมูลโดยรวมแล้ว จะต้องนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือแล้วหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งกับ FMU	Info
6.	<p>กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none">- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2	ทุกฝ่าย
